



Ist-Prozess

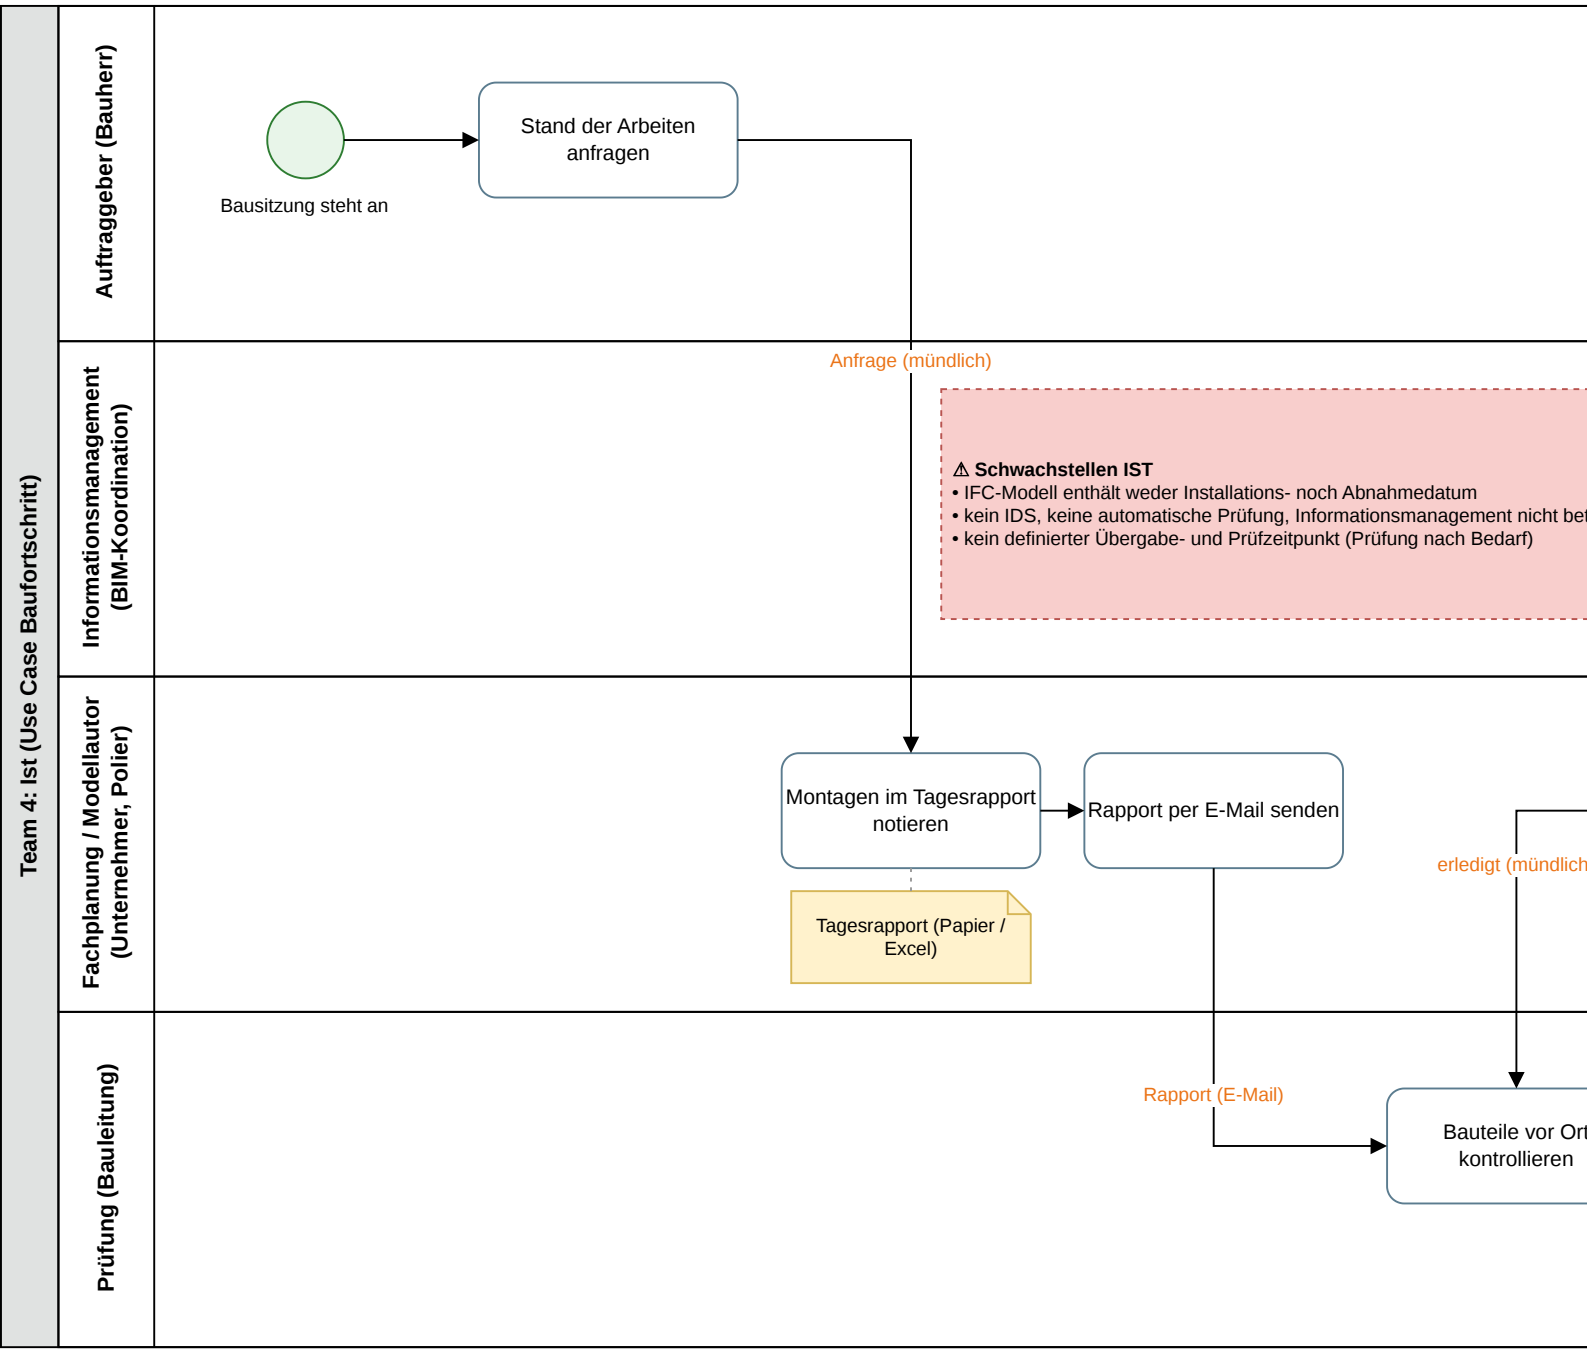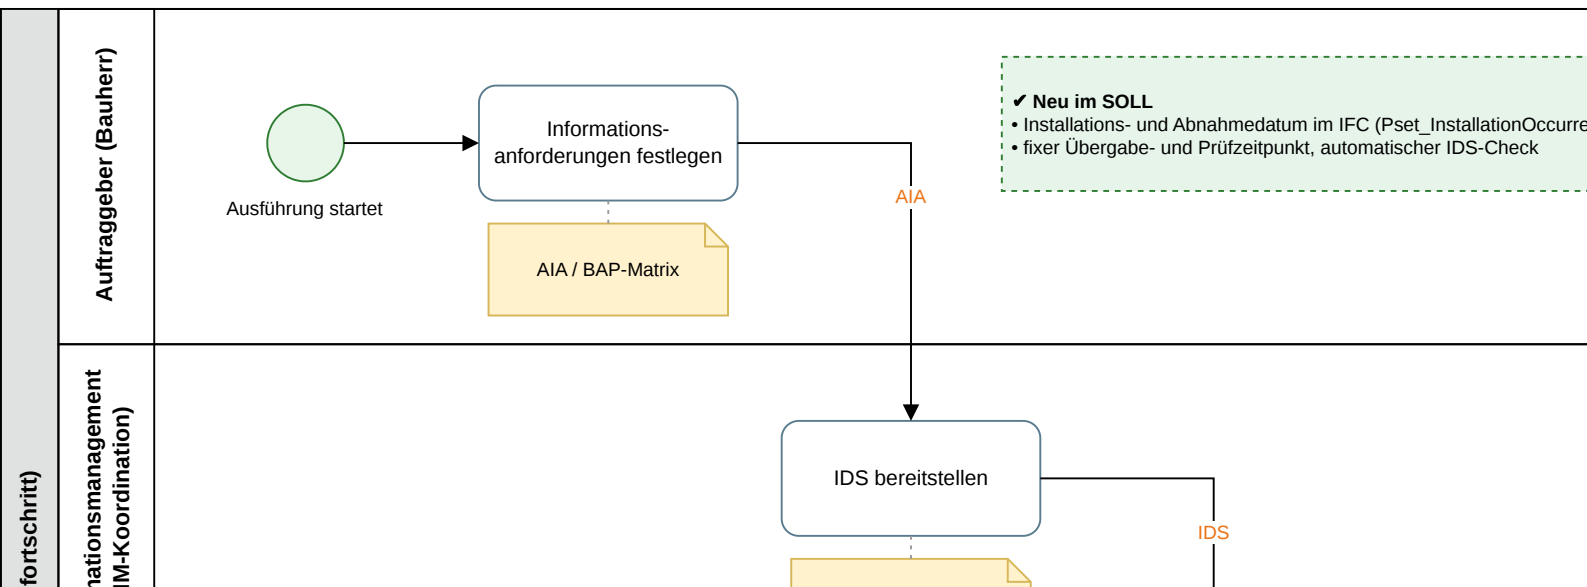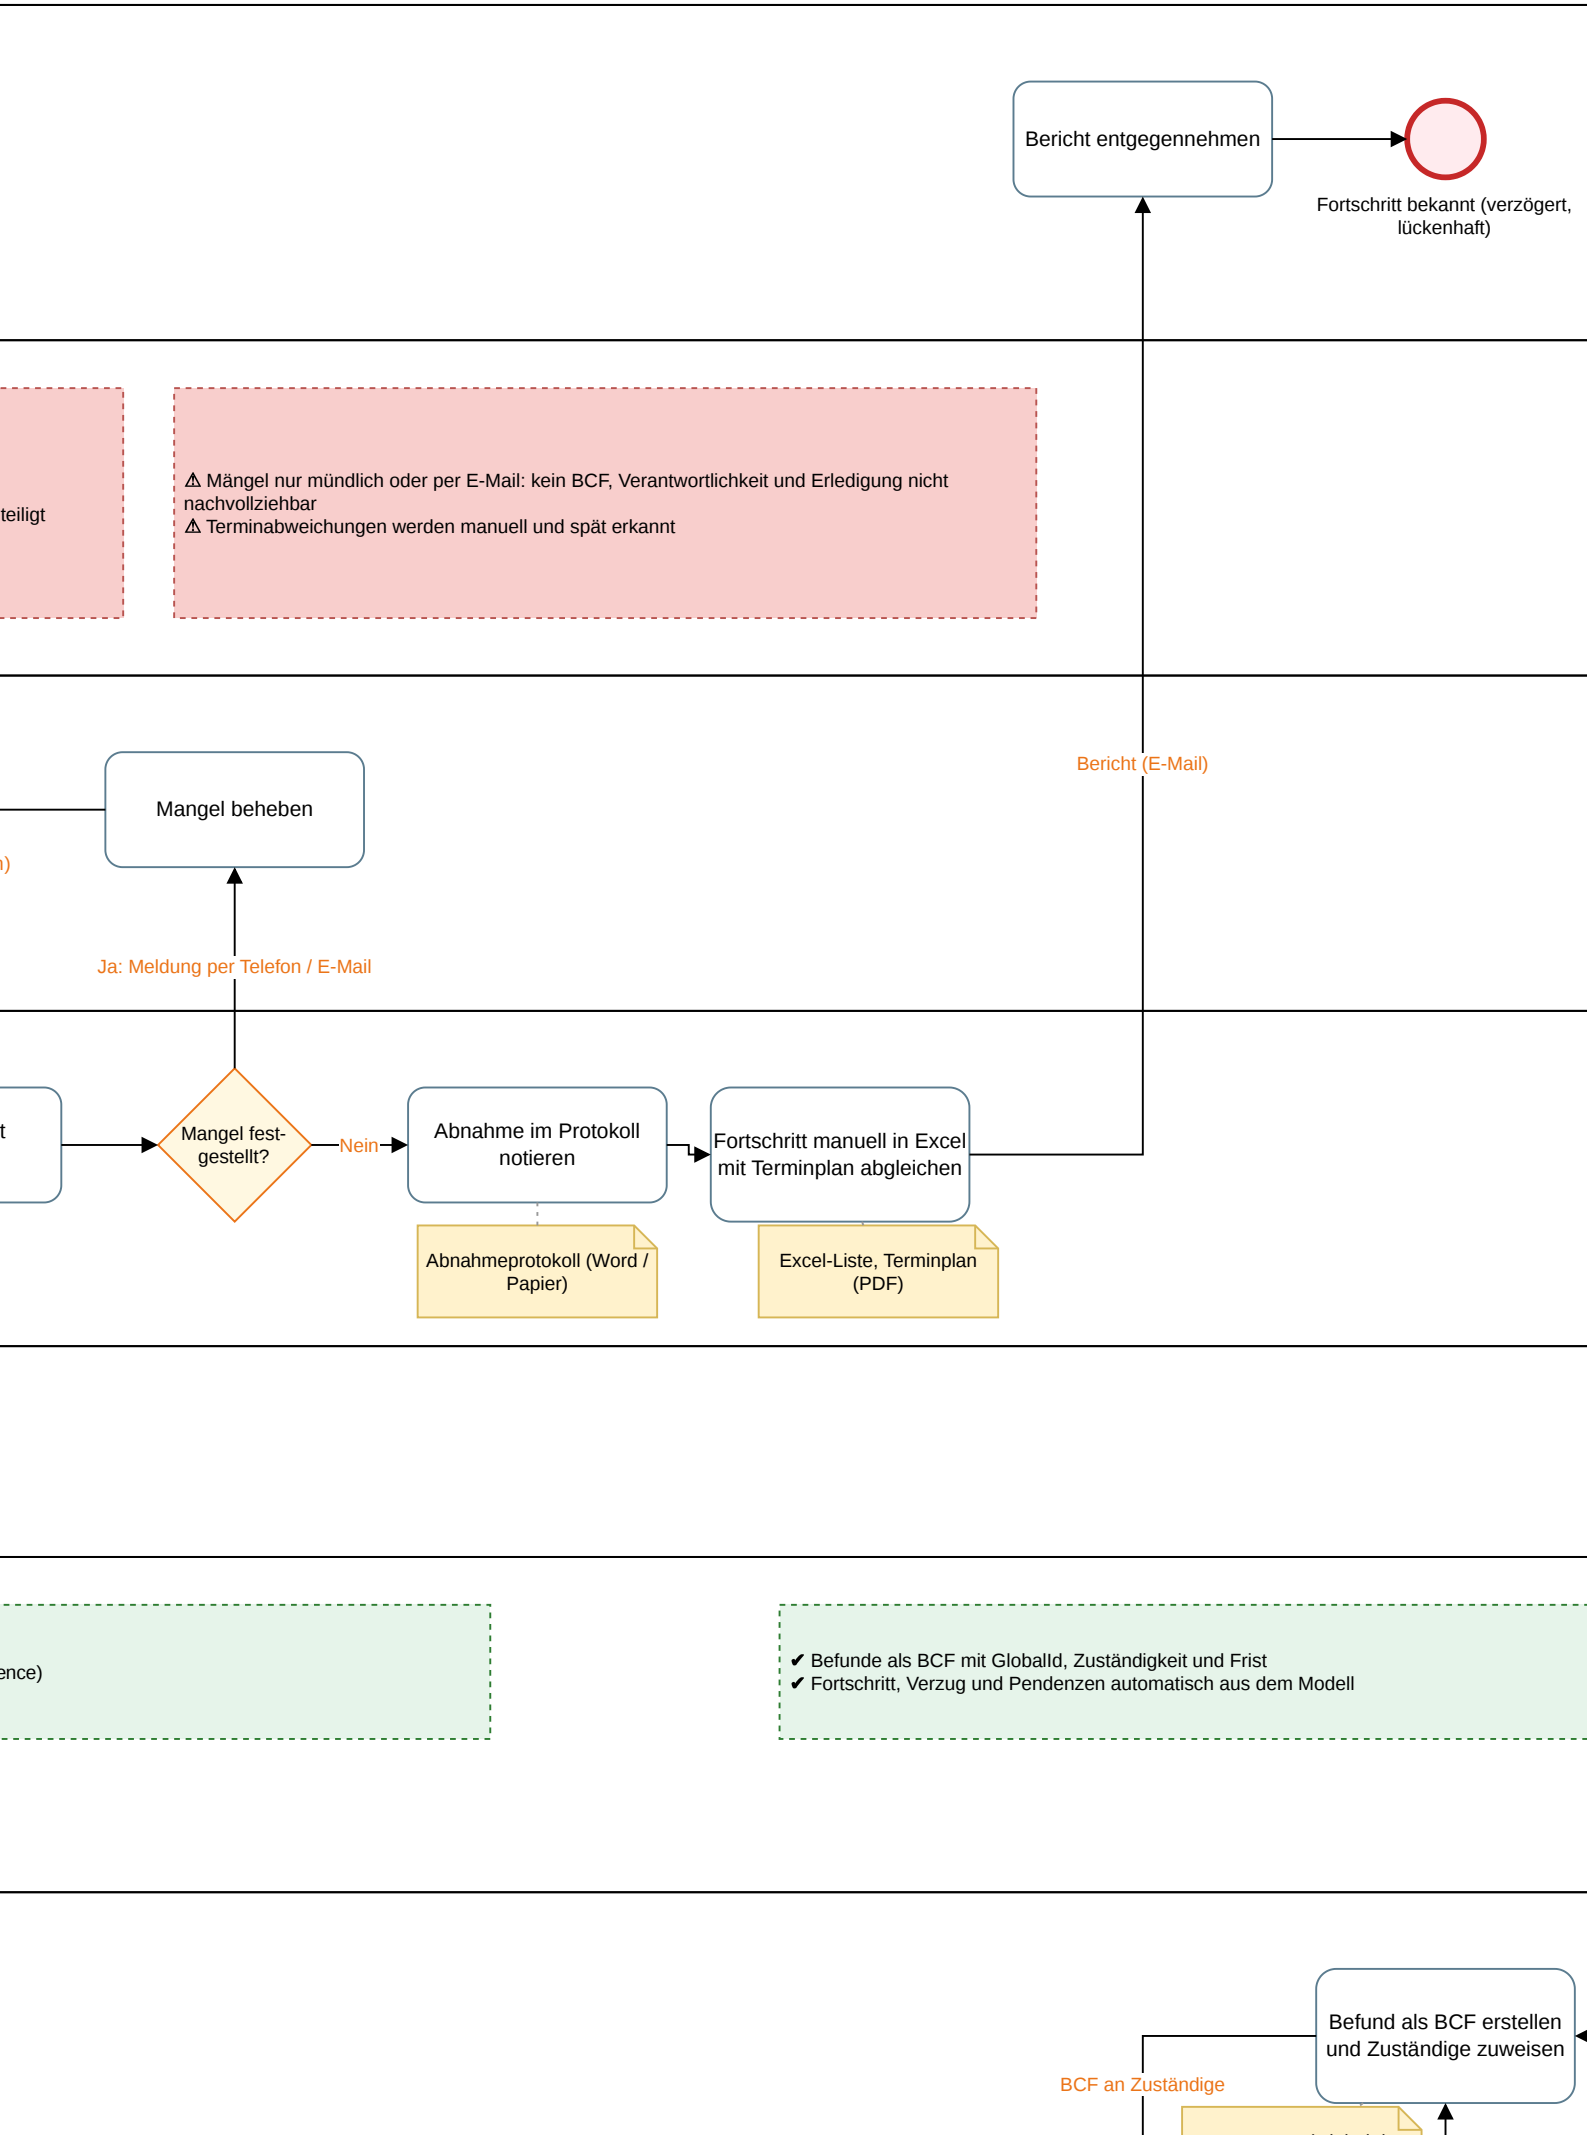



Soll-Prozess

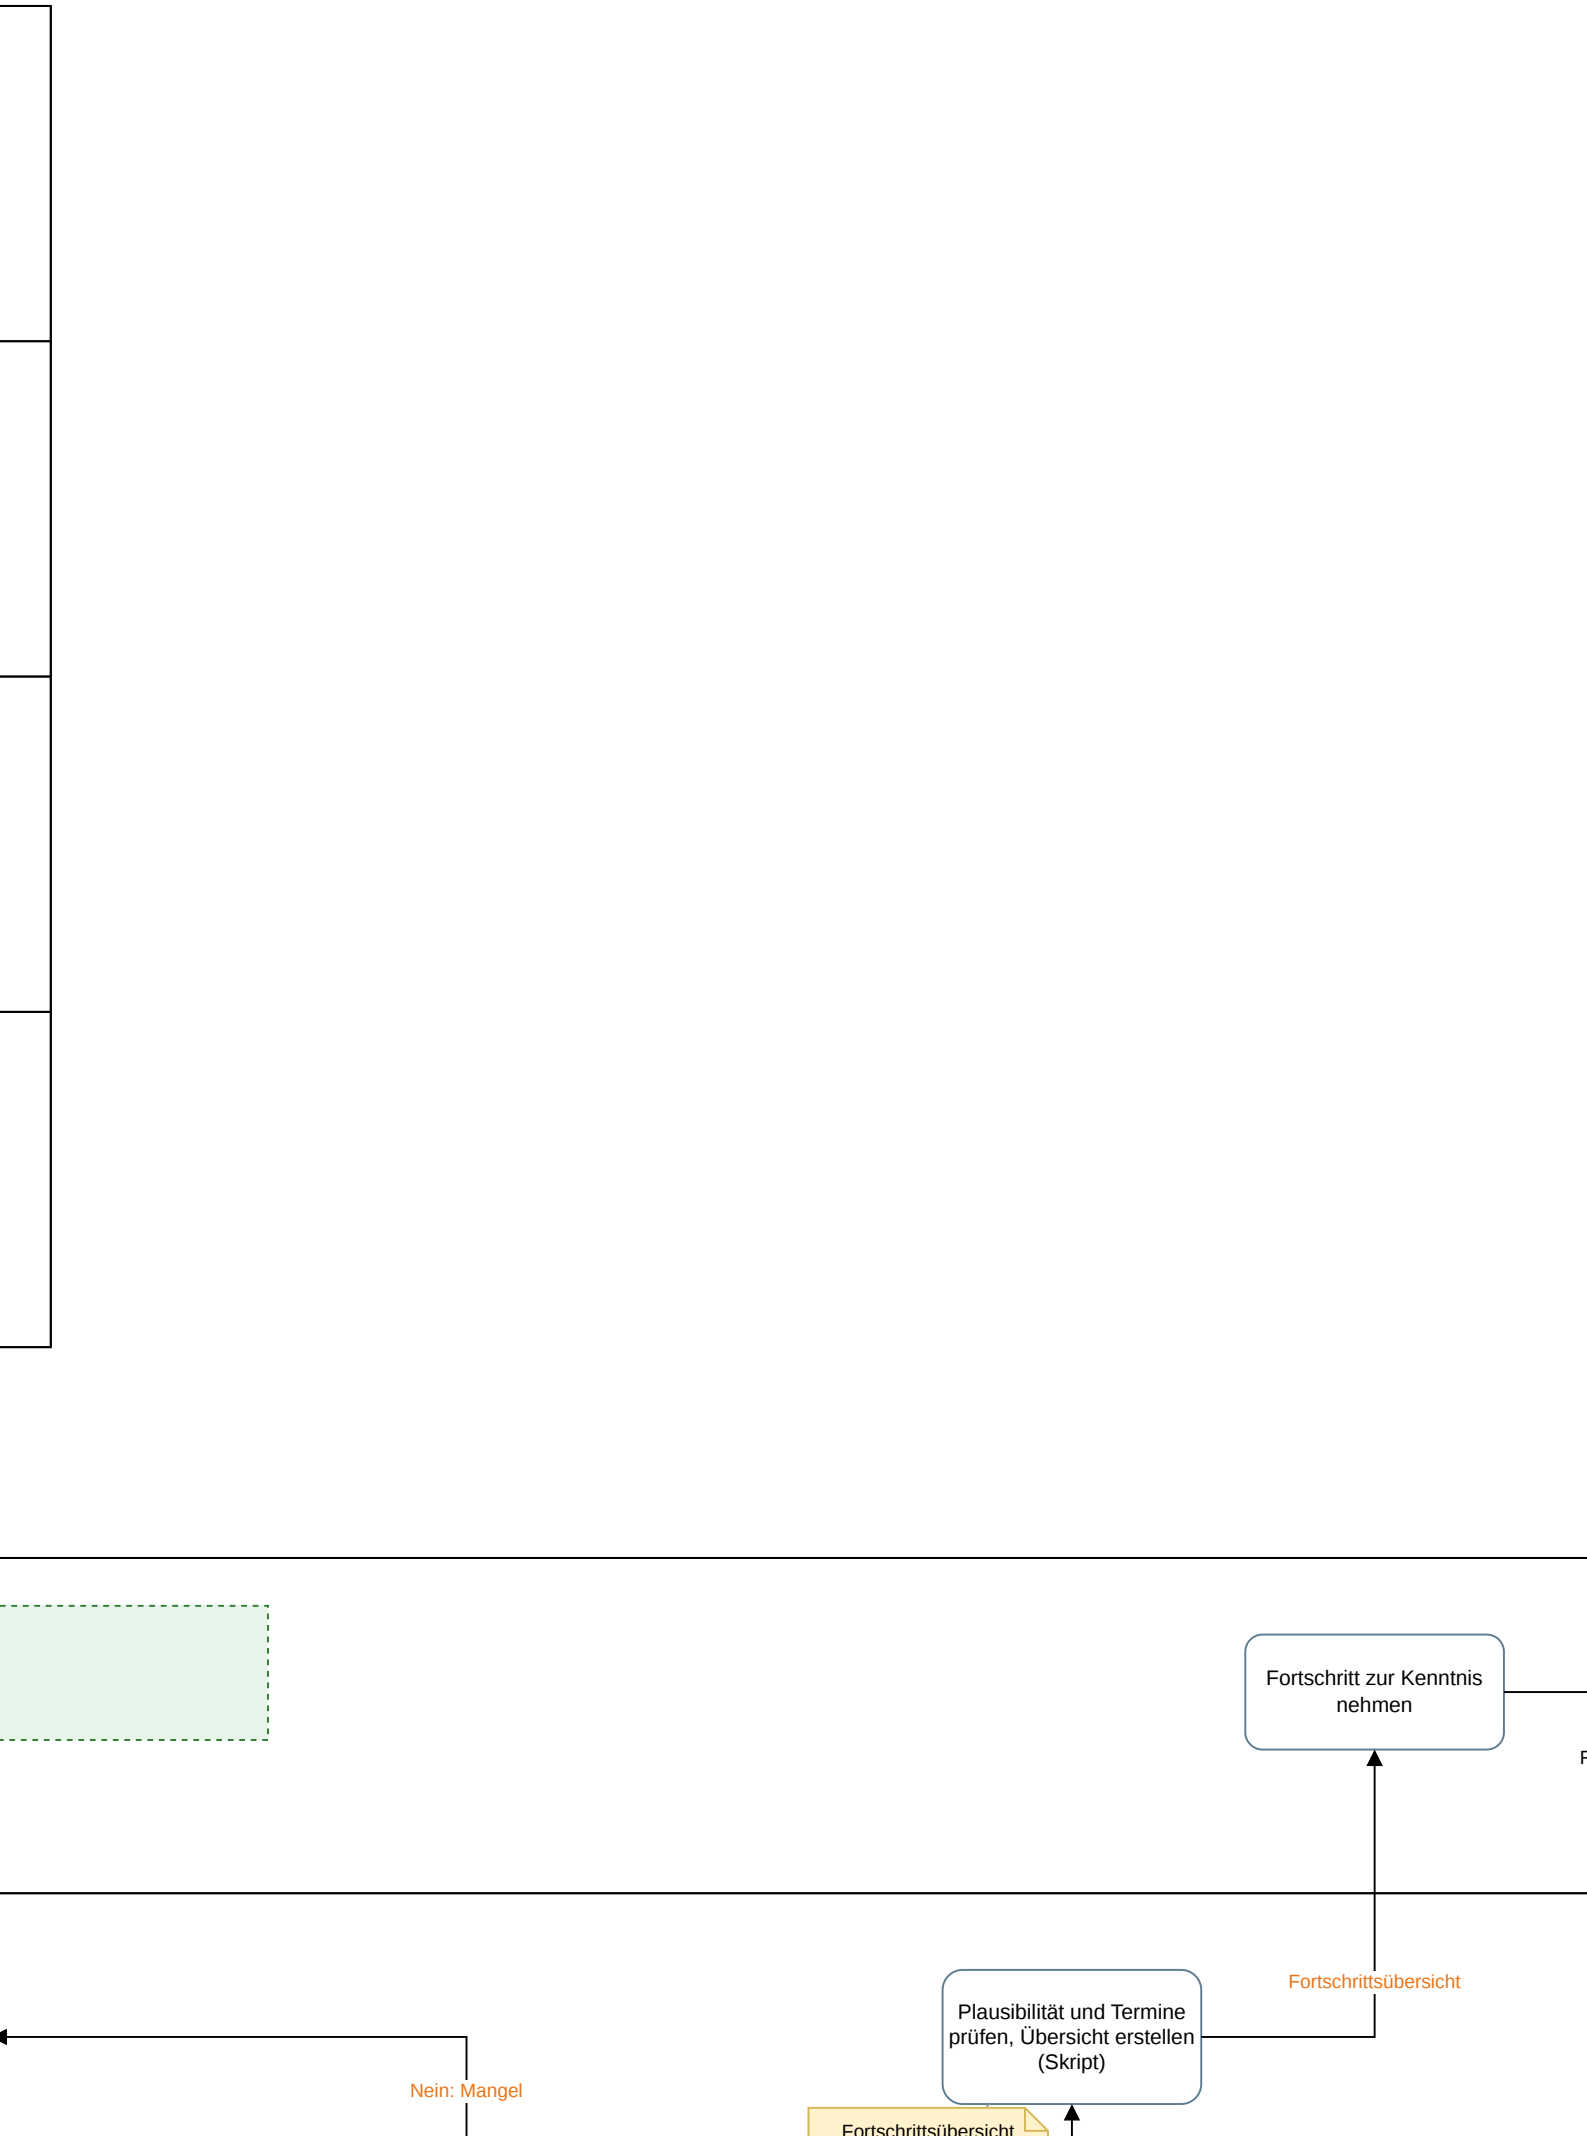


Bericht entgegennehmen
Fortschritt bekannt (verzögert, lückenhaft)
teiligt
⚠ Mängel nur mündlich oder per E-Mail: kein BCF, Verantwortlichkeit und Erledigung nicht nachvollziehbar
⚠ Terminabweichungen werden manuell und spät erkannt
Bericht (E-Mail)
Mangel beheben
)
Ja: Meldung per Telefon / E-Mail
t
Mangel fest-gestellt?
Nein
Abnahme im Protokoll notieren
Fortschritt manuell in Excel mit Terminplan abgleichen
Abnahmeprotokoll (Word / Papier)
Excel-Liste, Terminplan (PDF)
ence)
✔ Befunde als BCF mit GlobalId, Zuständigkeit und Frist
✔ Fortschritt, Verzug und Pendenzen automatisch aus dem Modell
Befund als BCF erstellen und Zuständige zuweisen
BCF an Zuständige



Fortschritt zur Kenntnis nehmen
Fortschrittsübersicht
Plausibilität und Termine prüfen, Übersicht erstellen (Skript)
Nein: Mangel
Fortschrittsübersicht

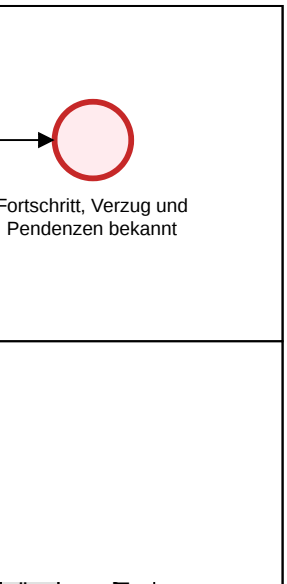
Fortschritt, Verzug und
Pendenzen bekannt

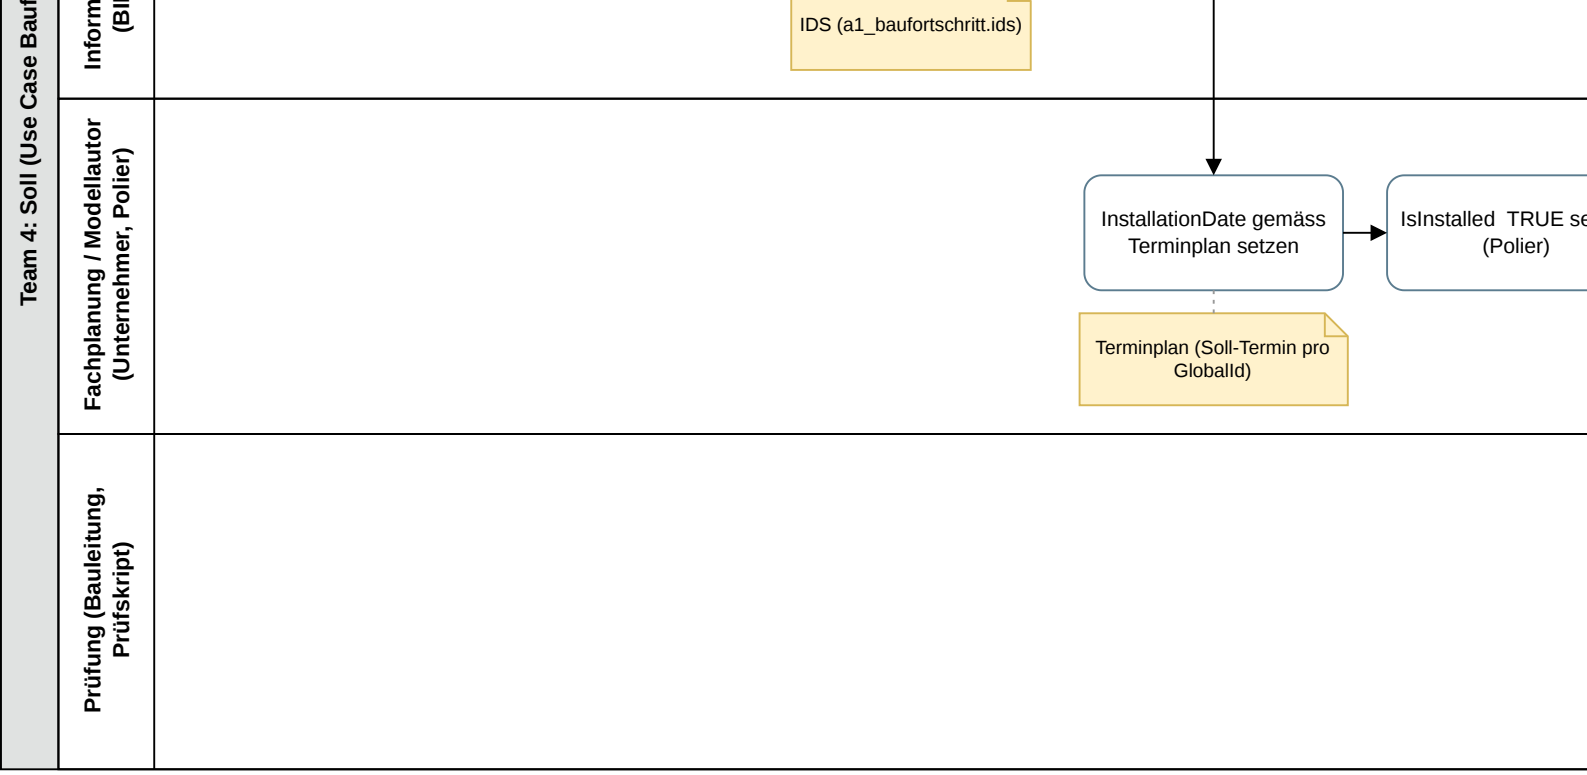

Team 4: Soll (Use Case Bauf
Inform
(Bl
IDS (a1_baufortschritt.ids)
Fachplanung / Modellautor (Unternehmer, Polier)
InstallationDate gemäss Terminplan setzen
IsInstalled TRUE se
(Polier)
Terminplan (Soll-Termin pro GlobalId)
Prüfung (Bauleitung, Prüfskript)

Legende


Start
Ende
Aktivität
Ja/Nein?
Übergabe- / Prüfzeitpunkt
Artefakt
Schwac

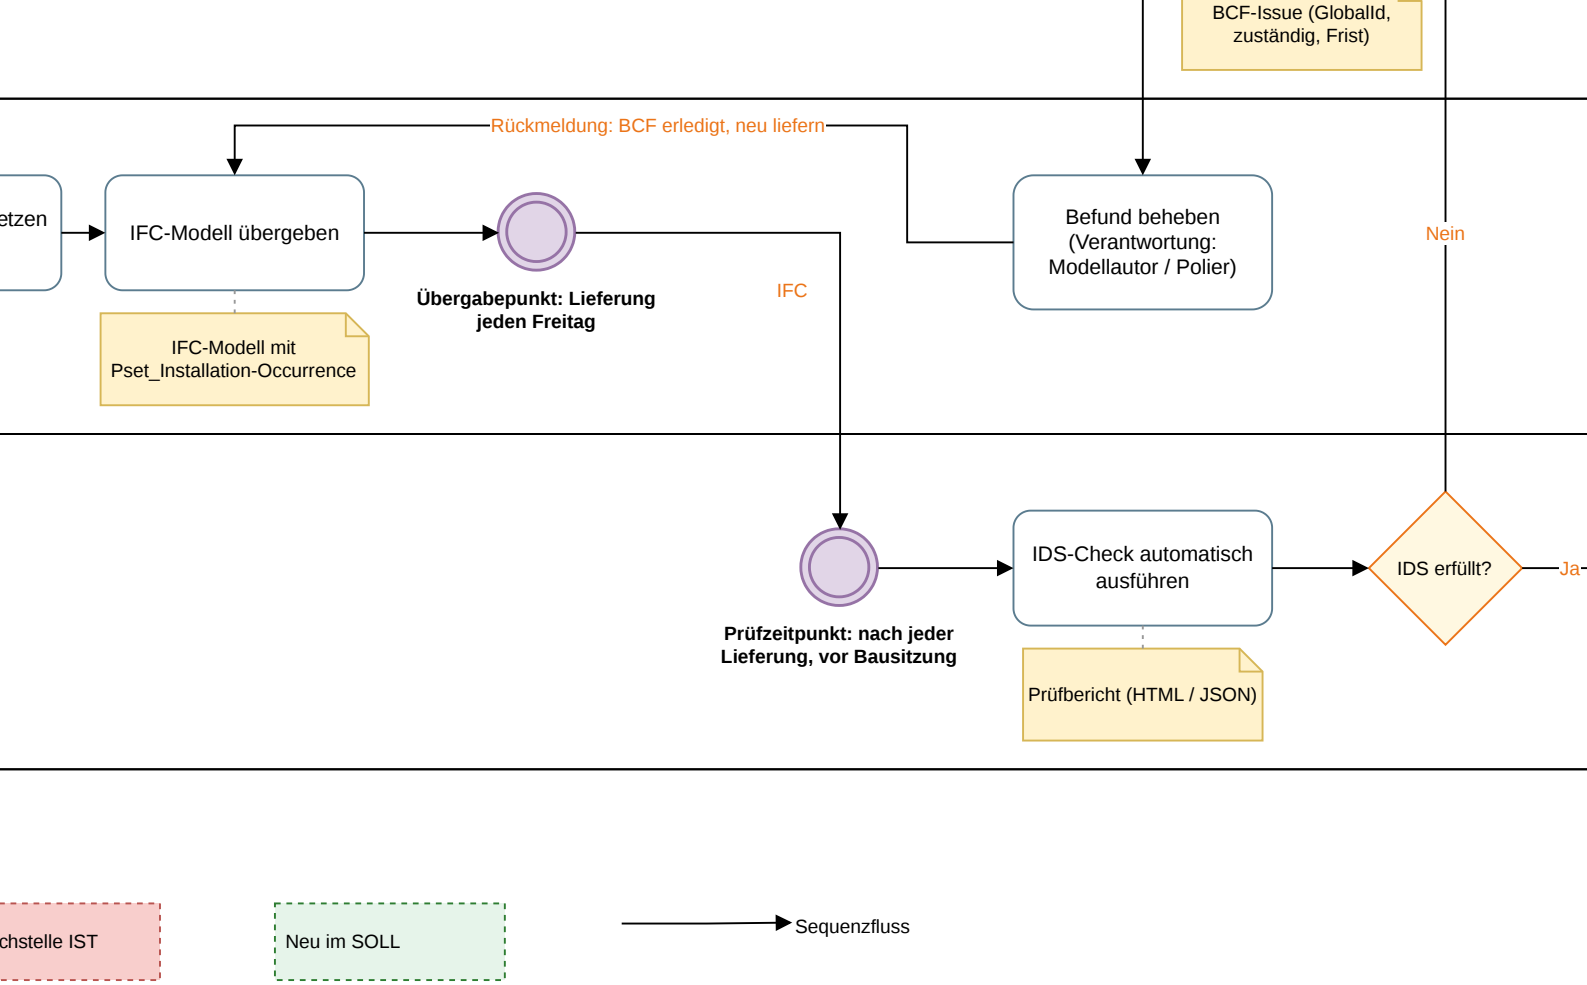
BCF-Issue (GlobalId, zuständig, Frist)
Rückmeldung: BCF erledigt, neu liefern
etzen
IFC-Modell übergeben
IFC-Modell mit Pset_Installation-Occurrence
Übergabepunkt: Lieferung jeden Freitag
IFC
Befund beheben (Verantwortung: Modellautor / Polier)
Nein
Prüfzeitpunkt: nach jeder Lieferung, vor Bausitzung
IDS-Check automatisch ausführen
Prüfbericht (HTML / JSON)
IDS erfüllt?
Ja

chstelle IST
Neu im SOLL
Sequenzfluss

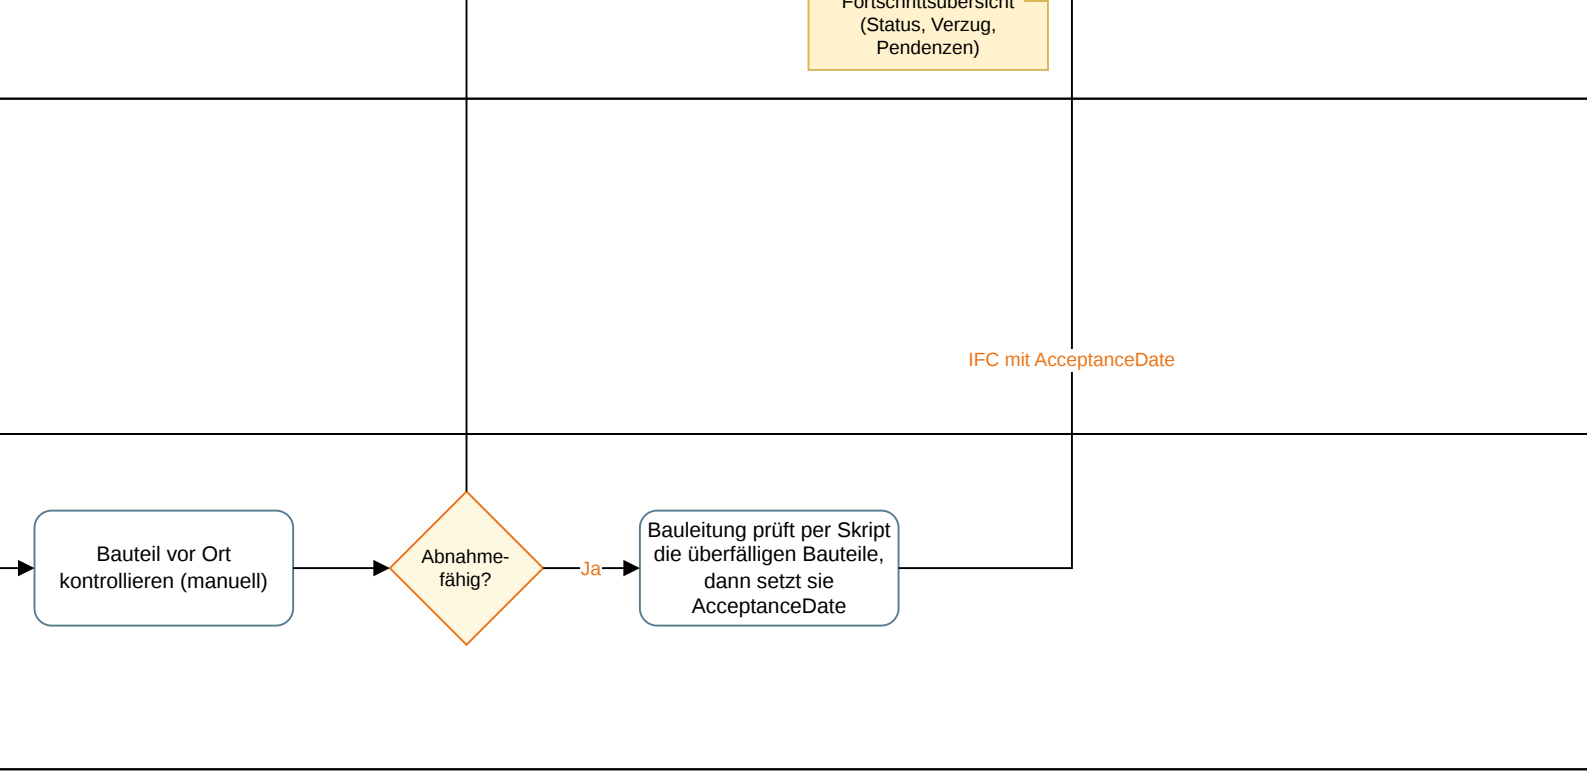
Fortschrittsübersicht (Status, Verzug, Pendenzen)
IFC mit AcceptanceDate
Bauteil vor Ort kontrollieren (manuell)
Abnahme-fähig?
Ja
Bauleitung prüft per Skript die überfälligen Bauteile, dann setzt sie AcceptanceDate
